



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO, COMUNIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 335,105.00	\$ 335,105.00	
TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO					\$ 335,105.00	
						FINIQUITO \$288,883.62
						IVA 16% \$46,221.38
						SUBTOTAL \$335,105.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$335,105.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$	100,531.50			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	100,531.50			
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:		\$	-			
SALDO POR AMORTIZAR		\$	-			
					ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 335,105.00
					ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
					SALDO POR ESTIMAR	\$ -

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 21		OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
	PERIODO:	DEL	10 DE AGOSTO DE 2020		UBICACIÓN:	SAN MARTIN
		AL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	335,105.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019		EJERCICIO:	FISCAL 2020
FECHA:		07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	DESGLOSE DE ESTIMACIÓN			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	12,100.00	-	24,200.00
04-ELECT-523	SUMINISTRO E INTALACION DE TORRECILLA INCLUYE:, ACARREO, EXCAVACION PARADO Y PLOMEADO, RELLENO CON CONCRETO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00	1.00	-	1.00	56,000.00	-	56,000.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	2,200.00	-	2,200.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	260.00	-	260.00
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	2,220.00	-	4,440.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	315.00	-	630.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,020.00	-	1,020.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	635.00	-	635.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	120.00	-	240.00
04-ELECT-447	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	260.00	-	260.00
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	300.00	-	300.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	430.00	-	1,720.00

SUMA HOJA No. 1 - 91,905.00

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CONTRATISTA
--	--	--




	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 21	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
	PERIODO:	DEL	10 DE AGOSTO DE 2020		UBICACIÓN:	SAN MARTIN
		AL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	335,105.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019			EJERCICIO:	FISCAL 2020
FECHA:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	295.00	-	1,180.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	120.00	-	1,920.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	340.00	-	6,800.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	670.00	-	2,010.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	390.00	-	780.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	770.00	-	770.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	530.00	-	1,590.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	295.00	-	885.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	335.00	-	335.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	460.00	-	460.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	132.00	-	132.00
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	40.00	40.00	-	40.00	98.00	-	3,920.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,358.00	-	1,358.00
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	160.00	-	320.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	26.00	26.00	-	26.00	135.00	-	3,510.00

SUMA HOJA No. 2

- 25,970.00

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CONTRATISTA
--	--	--



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PERIODO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	120.00	-	480.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	120.00	-	2,400.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	Ml	55.00	55.00	-	55.00	235.00	-	12,925.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	65.00	65.00	-	65.00	50.00	-	3,250.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	340.00	-	680.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	1,140.00	-	2,280.00
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	10.00	10.00	-	10.00	720.00	-	7,200.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	530.00	-	1,060.00
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	3.00	3.00	-	3.00	715.00	-	2,145.00
04-ELECT-524	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-25-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	pza	1.00	1.00	-	1.00	121,200.00	-	121,200.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	10.00	10.00	-	10.00	295.00	-	2,950.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	16,400.00	-	49,200.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	720.00	-	2,160.00

SUMA HOJA No. 3

207,930.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2					1.00 1.00	1.00 1.00		
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-523	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TORRECILLA INCLUYE:, ACARREO, EXCAVACIÓN PARADO Y PLOMEADO, RELLENO CON CONCRETO, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		TORRECILLA 1					1.00	1.00		
TOTAL									1.00		pza
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					1.00	1.00		
TOTAL									1.00		pza


 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJEGUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				1.00	1.00			
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-2				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-2				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				1.00	1.00			
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				1.00	1.00			
								TOTAL		1.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				4.00	4.00			
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				16.00	16.00			
TOTAL									16.00		pza
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				20.00	20.00			
TOTAL									20.00		pza
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				3.00	3.00			
TOTAL									3.00		pza
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				2.00	2.00			
TOTAL									2.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCÍA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 11 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					3.00	3.00		
								TOTAL		3.00	pza
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					1.00	1.00		
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					1.00	1.00		
								TOTAL		1.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 12 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020




OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB.TOTAL	
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-2				1.00	1.00			
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-2		40.00		40.00	40.00			
								TOTAL		40.00	mL
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-2				1.00	1.00			
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-2				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				26.00	26.00			
								TOTAL		26.00	pza


 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCÍA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 13 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				4.00	4.00			
								TOTAL		4.00	pza
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2				20.00	20.00			
								TOTAL		20.00	pza
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2		55.00		55.00	55.00			
								TOTAL		55.00	MI
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2		65.00		65.00	65.00			
								TOTAL		65.00	mL

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 14 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANGHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					2.00	2.00		
								TOTAL		2.00	kg
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					2.00	2.00		
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					10.00	10.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 15 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2								
									TOTAL	10.00	kg
							2.00	2.00			
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2								
									TOTAL	2.00	pza
							3.00	3.00			
04-ELECT-524	SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1-25-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS		POSTE 1-2								
									TOTAL	3.00	kg
							1.00	1.00			

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 16 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2		10.00						
								TOTAL		1.00	pza
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2								
								TOTAL		10.00	mL
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2								
								TOTAL		3.00	pza
								TOTAL		3.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 17 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					20.00	20.00		
								TOTAL	20.00		pza
04-ELECT-297	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-2					1.00	1.00		
								TOTAL	1.00		pieza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCÍA
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 18 DE 21
 PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
 UBICACIÓN: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

CROQUIS DE OBRA

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- LINEA AEREA PRIMARIA
- LINEA AEREA SECUNDARIA
- LINEA AEREA SECUNDARIA CON CABLE MULT
- TRANSFORMADOR PROYECTADO
- TRANSFORMADOR EXISTENTE
- ANILLO
- CORTACIRCUITO FUSIBLE (COFI)
- CONEXIÓN A TIERRA
- LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO
- LAMPARA DE VAPOR DE SODIO
- TORRELLA METALICA
- POSTO PROYECTADO
- POSTO EXISTENTE
- INTERVEN DE ANILLO
- INTERVEN DE BANCARTE
- INTERVEN DE BANDA Y ANILLO
- INTERVEN DE POSTO A POSTO
- CADA UNIFICACION DE CARGAS
- LOTE EXISTENTE
- CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO DE ESTRUCTURAS

No. POSTO	ALTIMETRIA Y RESISTENCIA	LUM	PRIMARIO	SECUNDARIO	No. SERIE	POSTO	CONEXIONES LINEAS (SERIE) Y (PORTES)
01	PC 12-700	20	12000	12000	12000	12000	12000
02	PC 12-700	20	12000	12000	12000	12000	12000
03	PC 12-700	20	12000	12000	12000	12000	12000

DIAGRAMA DE ALUMBRADO

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.
 AV. LAS CUMBRES NUM 148, C.P. 98085,
 COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC.
 TEL. 4921302551, 4921111277
 aguirre_construcciones@outlook.com
 proyectos3_construcciones@outlook.com

PLANO REVISION DP5300008844/2020
 No. DE CONTROL PM-226/2020

LA C.F.E. DIVISION BAJO ZONA FRESNILLO CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020.

ING. FERNANDO TORRES CHAVEZ JEFE REGIONAL DE SOMBRERETE
 ING. FABIAN ALFONSO CARMONA MARRIN JEFE DE DEPTO DE PLANEACION

ING. HECTOR ULICES GARCIBAY BORDA DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION
 ING. ALFREDO SALDIVAR BASGARA SUPPTE. ZONA FRESNILLO

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISION BAJO ZONA FRESNILLO
REPLAZO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 15 KVA A 25 KVA PARA EXT DE SECUNDARIO
EN CALLEJON MELCHOR O CAMPO
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE

ESCALA	FECHA
1 : 750	AGOSTO DE 2020

PREPARED: ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 REVISADO: ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 PROYECTO: ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA

PLANO No. 1-1 REVISION A

CUADRO DE CARGAS

No. AREA	No. SERVO	CARGA KW	No. LINEAS	CARGA KW	TOTAL KW	TOTAL KW A SERVO	TOTAL KW	TORRELLA	TRANSFORMADOR CAPACIDAD ECONOMICA	% CARGA
1	1	20	2	40	60	60	60	20 KVA	200/100	100%

DATOS DE CONSTRUCCIÓN

TORRELLA TAT-12
 POSTE 12-750
 LINEA SECUNDARIA CABLE MULT. 2+1(1/0)
 1 PZA
 2 PZA
 50 MTS

CÓDIGO DE COLORES

EL COLOR	SIGNIFICADO
● ROJO	ANTALAN
● AZUL	NO CABLE
● AMARILLO	RELOCACION
● VERDE	CONEXIONES
● NARANJA	DATOS DE REFERENCIA

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
 CONTRATISTA

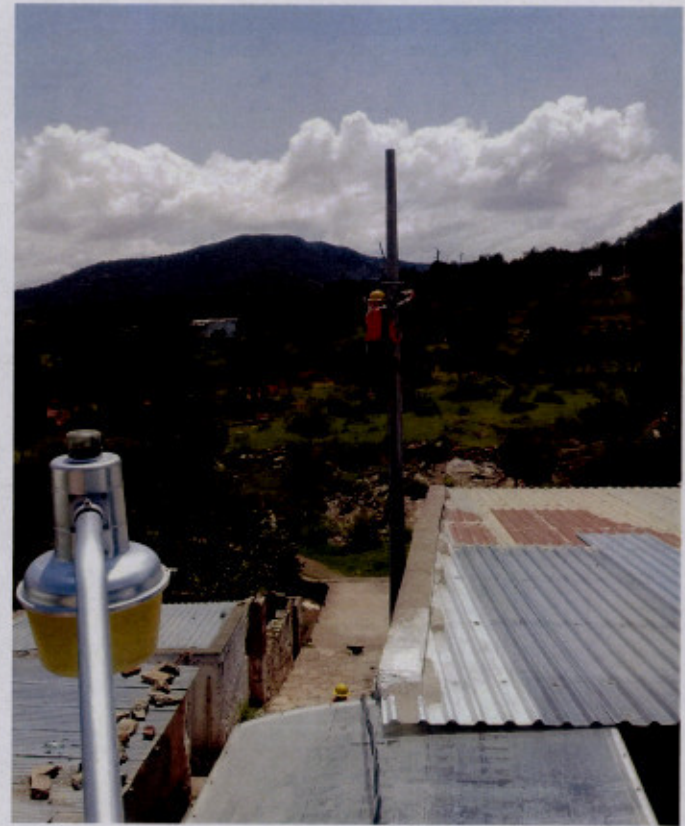


ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 19 DE 21
PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
UBICACIÓN: SAN MARTIN
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 20 DE 21
PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

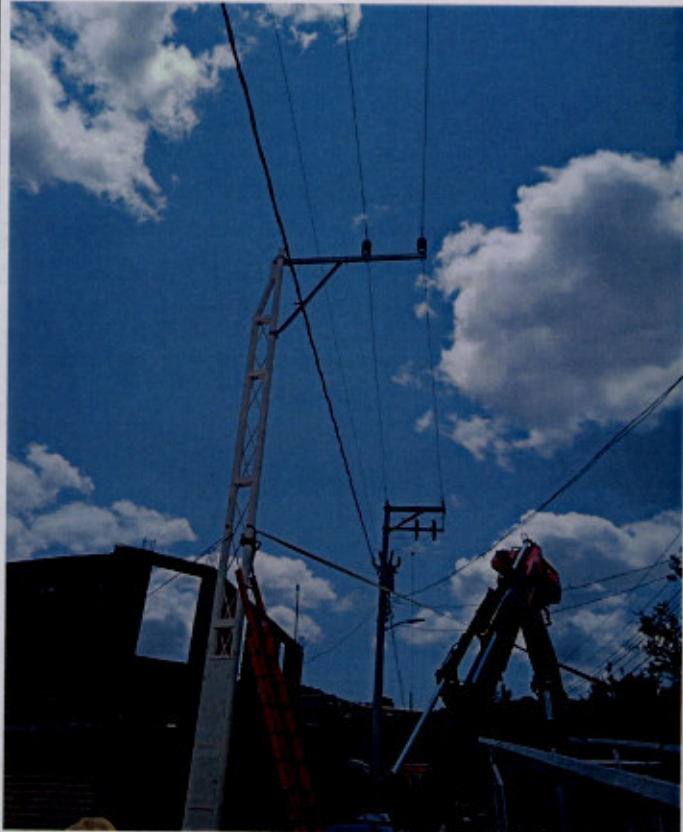
RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
UBICACIÓN: SAN MARTIN
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 21 DE 21
PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 335,105.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR O'CAMPO
UBICACIÓN: SAN MARTIN
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA
