



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
 PERIODO: 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 302,234.28
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISM-20-AGUA-020
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
 UBICACIÓN MATEO GOMEZ
 MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1	LOTE	\$ 302,234.28	\$ 302,234.28	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 302,234.28	
						FINIQUITO \$260,546.79
						IVA 16% \$41,687.49
						SUBTOTAL \$302,234.28
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$302,234.28
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO: \$ 90,670.28
 ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 90,670.28
 ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
 SALDO POR AMORTIZAR \$ 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
 ESTIMADO A LA FECHA: \$ 302,234.28
 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
 SALDO POR EJERCER \$ -

ARC. JUAN RIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN RESURRE FERNANDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6
 PERIODO: 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 302,234.28
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISM-20-AGUA-020
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
 UBICACIÓN: MATEO GOMEZ
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	
13-EQU-015	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 3" DE Ø, CON ROSCAS Y COPLES.	ml	153.60	153.60	0.00	153.60	\$ 723.00	\$ -	\$ 111,052.80	
15-E-POZO-016	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 6 AWG., MARCA "CONDUCTORES DEL NORTE"	ml	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 282.04	\$ -	\$ 2,820.38	
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda.	ml	163.60	163.60	0.00	163.60	\$ 15.50	\$ -	\$ 2,535.80	
14-ACCES-048	MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 3" DE DIÁMETRO, ANALÓGICO, BRIDADO, LECTURA INSTANTÁNEA Y TOTALIZADOR EN METROS CÚBICOS, MARCA VERMAD O SIMILAR.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,045.10	\$ -	\$ 12,045.10	
14-ACCES-043	MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE CORTE DE TUBOS, SOLDADURA, BRIDAS, EMPAQUES, CONEXIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00	
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 27,500.00	\$ -	\$ 27,500.00	
04-ELECT-206	ARRANCADOR COMBINADO ATP PARA 20 HP, 3F, 440 VOLTS, CON INTERRUPTOR INTEGRADO Y REVELADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCION CONTRA ALTO Y BAJO VOLTAJE, AUSENCIA DE FASE Y DESBALANCEO DE FASE.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	
04-ELECT-281	RELOCALIZACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HACIA LA CASETA, INCLUYE, CANALIZACIONES, CABLES, MEDICIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	
04-ELECT-245	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, INTENSIFICADOR DE TIERRAS GEM, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA SOBRETENSIONES Y APAGONES.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	
04-ELECT-230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 30 KVA, 3F, 33,000-440/254 V, POSTE, INCLUYE COLOCAICÓN, PUESTA EN MARCHA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 83,793.00	\$ -	\$ 83,793.00	
04-ELECT-450	GABINETE PARA ALOJAR ARRANCADOR.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,987.20	\$ -	\$ 4,987.20	
								\$	\$ -	\$ 302,234.28

SUMA HOJA No. 01

\$ - \$ 302,234.28

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR VAZQUEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
15-E-POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE.	1-4	A-D	EXT RÓMRA				1.00	1.00	lote	
13-EQU-015	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 3" DE Ø. CON ROSCAS Y COPLES.	1-4	A-D	COLUMNA	153.60			153.60	153.60	ml	
15-E-POZO-016	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 6 AWG., MARCA "CONDUCTORES DEL NORTE"	1-4	A-D	CABLE	10.00			10.00	10.00	ml	
15-E-POZO-008	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE SONDA.	1-4	A-D	POLIDUCTO	163.00			163.00	163.00	ml	
14-ACCES-048	MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 3" DE DIÁMETRO, ANALÓGICO, BRIDADO, LECTURA INSTANTÁNEA Y TOTALIZADOR EN METROS CÚBICOS, MARCA VERMAD O SIMILAR.	1-4	A-D	MEDIDOR				1.00	1.00	pza	
14-ACCES-043	MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE CORTE DE TUBOS, SOLDADURA, BRIDAS, EMPAQUES, CONEXIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	1-4	A-D	MOD. AL TREN				1.00	1.00	pza	
13-EQU-030	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA REBOMBEO	1-4	A-D	EQUIP. CLOR				1.00	1.00	lote	
04-ELECT-206	ARRANCADOR COMBINADO ATP PARA 20 HP, 3F, 440 VOLTS, CON INTERRUPTOR INTEGRADO Y REVELADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA ALTO Y BAJO VOLTAJE, AUSENCIA DE FASE Y	1-4	A-D	ARRANCADOR				1.00	1.00	pza	
04-ELECT-281	RELOCALIZACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN HACIA LA CASETA, INCLUYE, CANALIZACIONES, CABLES, MEDICIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA	1-4	A-D	REL ACOMET				1.00	1.00	lote	
04-ELECT-245	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG, INTENSIFICADOR DE TIERRAS GEM, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA SOBRETENSIONES Y APAGONES.	1-4	A-D	MEJ. SIST. TIERRA				1.00	1.00	lote	
15-E-POZO-009	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO.	1-4	A-D	INST BOMBA				1.00	1.00	lote	
04-ELECT-230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 30 KVA, 3F, 33,000-440/254 V, POSTE, INCLUYE COLOCAICÓN, PUESTA EN MARCHA, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1-4	A-D	TRANSFOR				1.00	1.00	pza	
04-ELECT-450	GABINETE PARA ALOJAR ARRANCADOR.	1-4	A-D	GABINETE				1.00	1.00	pza	
05-ACAB-015	PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	1-4	A-D	PINTURA				1.00	1.00	lote	
								1.00	1.00	lote	



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 302,234.28
No. DE CONTRATO: MSO-DD5-SOM-FISM-20-AGUA-020
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020


RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
UBICACIÓN: MATEO GOMEZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020


CROQUIS DE OBRA



Nombre: POZO PROFUNDO-MATEO GOMEZ
Latitud: 23°55'12.21"N
Longitud: 103°44'31.71"O


ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. EDGAR IVAN AGUIRRE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 6
 PERIODO: 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 302,234.28
 No. DE CONTRATO: MSO-DD5-SOM-FISM-20-AGUA-020
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020


RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
 UBICACIÓN: MATEO GOMEZ
 MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




 ARC. JUAN RIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. EDGAR VAN AGUIRRE FERNANDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 6
PERIODO: 10 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 302,234.28
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISM-20-AGUA-020
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

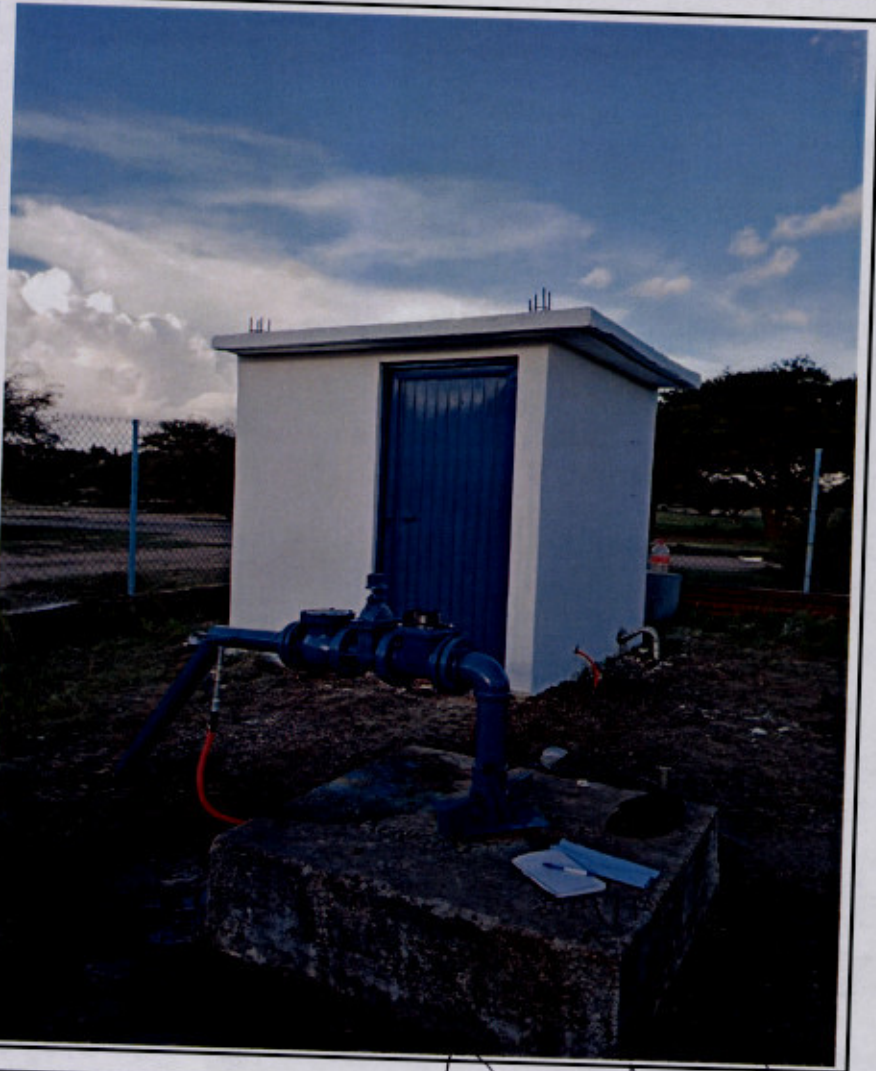
OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO

UBICACIÓN: MATEO GOMEZ

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN ASQUIRRE FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
