



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 8  
 PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2020

### CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 146,865.20	\$ 146,865.20	
	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 927,087.00	\$ 927,087.00	
	DRENAJE	1	LOTE	\$ 103,571.70	\$ 103,571.70	
	DESCARGA DOMICILIARIA	1	LOTE	\$ 70,050.00	\$ 70,050.00	
	AGUA POTABLE	1	LOTE	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	
<b>TOTAL DE FINIQUITO</b>					<b>\$ 1,255,073.90</b>	
						FINIQUITO \$1,081,960.26
						IVA 16% \$173,113.64
						<b>SUBTOTAL \$1,255,073.90</b>
						<b>DEDUCCIONES:</b>
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						<b>TOTAL \$1,255,073.90</b>
						<b>SUBTOTAL \$0.00</b>
						<b>IVA 16% \$0.00</b>
						<b>TOTAL \$0.00</b>

ANTICIPO OTORGADO:	\$	376,522.17				<b>RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:</b>
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	376,522.17				ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,255,073.90
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$	-				ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-				SALDO POR EJERCER \$ -

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 8  
 PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020


## RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2020

### DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST.	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>								
01-PRE-017	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	m2	1,490.85	1,490.85	0.00	1,490.85	\$ 12.00	\$ -	\$ 17,890.20
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D. DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	m3	385.00	385.00	0.00	385.00	\$ 335.00	\$ -	\$ 128,975.00
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>								<b>\$ -</b>	<b>\$ 146,865.20</b>
<b>PAVIMENTACION</b>									
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	246.00	246.00	0.00	246.00	\$ 260.00	\$ -	\$ 63,960.00
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBRETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	ml	245.62	245.62	0.00	245.62	\$ 350.00	\$ -	\$ 85,967.00
11-O-EXT-003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	354.00	354.00	0.00	354.00	\$ 340.00	\$ -	\$ 120,360.00
11-O-EXT-006	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	1192.00	1,192.00	0.00	1,192.00	\$ 525.00	\$ -	\$ 625,800.00
11-O-EXT-007	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00
03-ALB-076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3.00 MTS CON APLANADO EN AMBAS CARAS Y PINTADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
<b>TOTAL DE PAVIMENTACION</b>								<b>\$ -</b>	<b>\$ 627,067.00</b>
<b>SUMA HOJA No. 01</b>								<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,073,952.20</b>

  
 ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 C. JUAN MANCILLAS HAROS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 8  
 PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2020

### DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
<b>01</b>	<b>DRENAJE</b>								
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	82.62	82.62	0.00	82.62	\$ 335.00	\$ -	\$ 27,677.70
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	ml	91.80	91.80	0.00	91.80	\$ 25.00	\$ -	\$ 2,295.00
18-RED-ALCA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE	ml	153.00	153.00	0.00	153.00	\$ 280.00	\$ -	\$ 42,840.00
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	m3	107.40	107.40	0.00	107.40	\$ 35.00	\$ -	\$ 3,759.00
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 27,000.00
<b>TOTAL DE DRENAJE</b>								\$ -	\$ 103,571.70
	<b>DESCARGA DOMICILIARIA</b>								
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	90.00	90.00	0.00	90.00	\$ 335.00	\$ -	\$ 30,150.00
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	ml	90.00	90.00	0.00	90.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 2,250.00
18-RED-ALCA-006	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE , CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 34,500.00
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	m3	90.00	90.00	0.00	90.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 3,150.00
<b>TOTAL DE DESCARGA DOMICILIARIA</b>								\$ -	\$ 70,050.00
	<b>AGUA POTABLE</b>								
14-ACCES-003	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	pza	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 7,500.00
<b>TOTAL DE AGUA POTABLE</b>								\$ -	\$ 7,500.00
<b>SUMA HOJA No. 02</b>								\$ -	\$ 181,121.70
<b>TOTAL DE ESTA ESTIMACION</b>								\$ -	\$ 1,255,073.90

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 8  
 PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020


## RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2020

### NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-017	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-4	A-B	LIMP	153.00	9.7441			1490.85	1490.85	m2
<b>TOTAL</b>									1490.85		<b>m2</b>
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	1-4	A-B	EXCAV	153.00	9.8000	0.25677		385.00	385.00	m3
<b>TOTAL</b>									385.00		<b>m3</b>
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-4	A-B	RELLENO	153.00	9.8000	0.164064		246.00	246.00	m3
<b>TOTAL</b>									246.00		<b>m3</b>
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	A-B	GUARNICION	122.81				122.81	122.81	ml
		4	A-B	GUARNICION	122.81				122.81	122.81	ml
<b>TOTAL</b>									245.62		<b>ml</b>
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68 1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	1-2	A-B	BANQUET	122.81	1.44			177.00	177.00	m2
		3-4	A-B	BANQUET	122.81	1.44			177.00	177.00	ml
<b>TOTAL</b>									354.00		<b>m2</b>
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	2-3	A-B	PAVIMENTO	149.00	8.00			1192.00	1192.00	m2
<b>TOTAL</b>									1192.00		<b>m2</b>
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-B	TOPE	28.00				28.00	28.00	ml
<b>TOTAL</b>									28.00		<b>ml</b>
09-HERR-022	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE	1-4	A-B	LETRERO				1.00	1.00	1.00	pza
<b>TOTAL</b>									1.00		<b>pza</b>
03-ALB-076	COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3.00 MTS CON APLANADO EN AMBAS CARAS Y PINTADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1-4	A-B	PLACA				1.00	1.00	1.00	pza
<b>TOTAL</b>									1.00		<b>pza</b>

  
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 C. JUAN MANCILLAS HAROS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 8  
 PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO  
 HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2020

### NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	1-4	A-B	EXCAV	153.00	0.6000	0.90		82.62	82.62	m3
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	1-4	A-B	PLANT	91.80				91.80	91.80	ml
18-RED-ALCA-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE	1-4	A-B	TUBERIA	153.00				153.00	153.00	ml
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	2-3	A-B	RELLENO	153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	m3
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.	2	A-B	P. VISITA				3.00	3.00	3.00	pza
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	1-2	A-B	EXCAV	8.00	0.83	0.90	15.00	90.00	90.00	m3
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	1-4	A-B	PLANTILLA	6.00			15.00	90.00	90.00	ml
18-RED-ALCA-006	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1-4	A-B	DESC. DOM				0.00	0.00	0.00	pza
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	1-4	A-B	RELLENO	8.00	0.83	0.90	15.00	90.00	90.00	pza
14-ACCES-003	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	1-4	A-B	CONX. VIVIENDA				15.00	15.00	15.00	pza
									82.62	82.62	m3
									91.80	91.80	ml
									153.00	153.00	ml
									0.00	0.00	m3
									3.00	3.00	pza
									90.00	90.00	m3
									90.00	90.00	ml
									0.00	0.00	pza
									90.00	90.00	pza
									15.00	15.00	pza
									15.00	15.00	pza
									15.00	15.00	pza

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 8

PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN

UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

## CROQUIS DE OBRA



ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 8  
PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
MONTO CONTRATADO: \$ 1,255,073.90  
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO FISCAL 2020

### REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

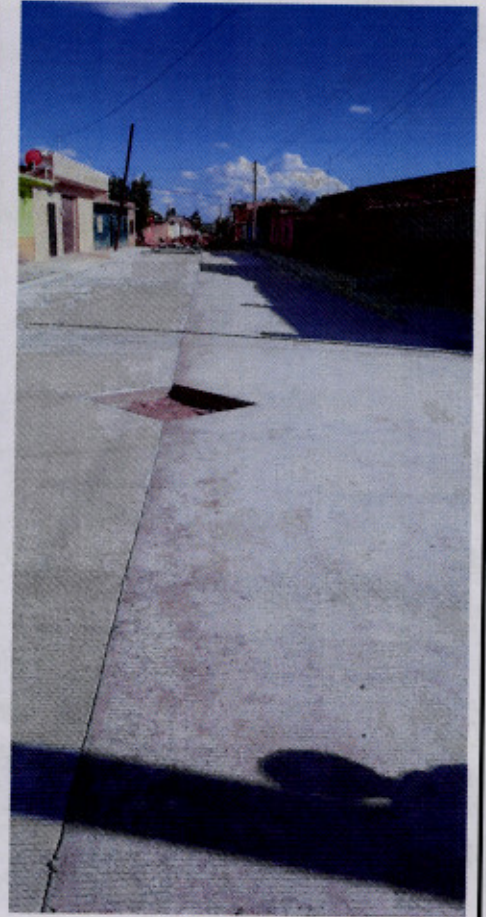


ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 8  
PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
MONTO CONTRATADO:  
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-006  
FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

## RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN  
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO FISCAL 2020

### REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
