ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 1 DE 8
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	635,860.98
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017	
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
UBICACIÓN:	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES	1	LOTE	$ 62,683.40	$ 62,683.40	
2	PAVIMENTACION	1	LOTE	$ 506,350.90	$ 506,350.90	
3	ALBAÑILERIA	1	LOTE	$ 53,126.70	$ 53,126.70	
4	DRENAJE	1	LOTE	$ 9,175.97	$ 9,175.97	
5	AGUA POTABLE	1	LOTE	$ 4,524.00	$ 4,524.00	
			TOTAL DE FINIQUITO		$ 635,860.98	

FINIQUITO	$548,156.02
IVA 16%	$87,704.96
SUBTOTAL	**$635,860.98**

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO	$0.00
TOTAL	**$0.00**
SUBTOTAL	**$0.00**
IVA 16%	**$0.00**
TOTAL	**$0.00**

ANTICIPO OTORGADO:	$	**190,758.29**
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	$	190,758.29
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:

ESTIMADO A LA FECHA:	$	635,860.98
ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR EJERCER	$	-

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 8	
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021		
MONTO CONTRATADO:	$	635,860.98	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-URB-017	
FECHA:		27 DE DICIEMBRE DEL 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
UBICACIÓN:	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	m2	681.80	681.80	0.00	681.80	$ 10.44	$ -	$ 7,117.99
2	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	m3	204.54	204.54	0.00	204.54	$ 232.00	$ -	$ 47,453.28
3	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	m2	26.98	26.98	0.00	26.98	$ 139.20	$ -	$ 3,755.62
4	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	32.38	32.38	0.00	32.38	$ 134.56	$ -	$ 4,356.51
	TOTAL DE PRELIMINARES							$ -	$ 62,683.40
	PAVIMENTACION								
5	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	136.36	136.36	0.00	136.36	$ 336.40	$ -	$ 45,871.50
6	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 40 LTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ml	105.60	105.60	0.00	105.60	$ 348.00	$ -	$ 36,748.80
7	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010	m2	119.00	119.00	0.00	119.00	$ 377.00	$ -	$ 44,863.00
8	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO	m2	514.00	514.00	0.00	514.00	$ 580.00	$ -	$ 298,120.00
9	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ml	15.50	15.50	0.00	15.50	$ 255.20	$ -	$ 3,955.60
10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN COLOR TABIQUE (014) MODELO DE ESTAMPADO TIPO ABANICO M-011 INCLUYE: PAVIMENTO, ESTAMPADO, COLOR, APLICACION DE SELLADOR TIPO SA25-003, HERRAMIENTA.	m2	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 754.00	$ -	$ 9,048.00
11	BANCA TACANÁ MUA-116/ 3 PERSONAS FABRICADO CON SOLERA DE 2" ½ Y PLASTIMADERA, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESODE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 210°. LARGO 1.50 M. ANCHO .65M. ALTO .75M. ANCHO ASIENTO.50M.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	$ 12,992.00	$ -	$ 25,984.00
								$ -	$ 464,590.90

SUMA HOJA No. 01 $ - $ 527,274.31

ING. LUIS ALBERTO ESTUDILLO SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S
ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO — HOJA 3 DE 8
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021
MONTO CONTRATADO:	$ 635,860.98
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
UBICACIÓN:	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
12	BARANDAL A BASE DE TUBO DE 3" CED. 30 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERAMIENTA MENOR Y TODO LO CORECTO PARA SU CORECTA EJECUCION.	ml	25.00	25.00	0.00	25.00	$ 1,670.40	$ -	$ 41,760.00
	TOTAL DE PAVIMENTOS							$ -	$ 41,760.00
	ALBAÑILERIA								
13	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	5.76	5.76	0.00	5.76	$ 232.00	$ -	$ 1,336.32
14	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,	ml	9.60	9.60	0.00	9.60	$ 205.32	$ -	$ 1,971.07
15	MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE	m3	29.66	29.66	0.00	29.66	$ 1,679.68	$ -	$ 49,819.31
	TOTAL DE ALBAÑILERIA							$ -	$ 53,126.70
	DRENAJE								
16	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	6.48	6.48	0.00	6.48	$ 232.00	$ -	$ 1,503.36
17	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.	ml	7.20	7.20	0.00	7.20	$ 48.72	$ -	$ 350.78
18	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE , CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	$ 3,364.00	$ -	$ 6,728.00
19	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO, A MANO	m3	6.48	6.48	0.00	6.48	$ 91.64	$ -	$ 593.83
	TOTAL DE DRENAJES							$ -	$ 9,175.97
	AGUA POTABLE								
20	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	pza	6.00	6.00	0.00	6.00	$ 754.00	$ -	$ 4,524.00
	TOTAL DE AGUA POTABLE							$ -	$ 4,524.00
								$ -	$ 108,586.67

SUMA HOJA No. 02	$ -	$ 108,586.67
TOTAL DE FINIQUITO	$ -	$ 635,860.98

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 8

PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021

MONTO CONTRATADO: $ 635,860.98

No. DE CONTRATO: MSO-DOS-FISM-21-URB-017

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

UBICACIÓN: COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
PRELIMINARES											
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-4	A-D	LIM Y TRAZ	70.00	9.74			681.80	681.80	m2
							TOTAL			681.80	m2
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	1-4	A-D	EXC.	70.00	9.74	0.30		204.54	204.54	m3
							TOTAL			204.54	m3
01-PRE-017	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	1-4	A-D	DEMOLICION	26.98	1.00			26.98	26.98	m2
							TOTAL			26.98	m2
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4	A-D	ACARREO	26.98	1.0000	1.20		32.38	32.38	m3
PAVIMENTOS							TOTAL			32.38	m3
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-4	A-D	RELLENO	70.00	9.74	0.20		136.36	136.36	m3
							TOTAL			136.36	m3
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-4	A-D	GUARNICION	105.60	1.00			105.60	105.60	ml
							TOTAL			105.60	ml
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-D	BANQUETA	113.33	1.05			119.00	119.00	m2
							TOTAL			119.00	m2
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y	1-4	A-D	PAV.	70.00	7.34			514.00	514.00	m2
							TOTAL			514.00	m2
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-D	TOPE	15.50	1.00			15.50	15.50	ml
							TOTAL			15.50	ml
11-O-EXT-016	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN COLOR TABIQUE (014) MODELO DE ESTAMPADO TIPO ABANICO M-011 INCLUYE: PAVIMENTO, ESTAMPADO, COLOR, APLICACION DE SELLADOR TIPO	1-4	A-D	pav.	9.60	1.25			12.00	12.00	m2
							TOTAL			12.00	m2

ING. LUIS ALBERTO ESCOBEDA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 5 DE 8	
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021		
MONTO CONTRATADO:	$ 635,860.98		
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017		
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021		

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

UBICACIÓN: COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	LOCALIZACIÓN TRAMO	LOCALIZACIÓN TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO PARCIAL	VOLÚMEN EJECUTADO SUB-TOTAL	UNIDAD
					0.00			2.00	2.00	2.00	pza
11-O-EXT-017	BANCA TACANA MUA-116/ 3 PERSONAS FABRICADO CON SOLERA DE 2" ½ Y PLASTIMADERA, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESODE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA	1-4	A-D	BANCA							
							TOTAL			2.00	pza
09-HERR-027	BARANDAL A BASE DE TUBO DE 3" CED. 30 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERAMIENTA MENOR Y TODO LO CORECTO PARA SU CORECTA EJECUCION.	1-4	A-D	BARANDAL	25.00				25.00	25.00	ML
							TOTAL			25.00	ML
ALBAÑILERIA											
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	1-4	A-D	EXC.	4.50	**0.80**	**1.60**		5.76	5.76	m3
										5.76	m3
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,	1-4	A-D	PLANT.	9.60				9.60	9.60	ml
							TOTAL			9.60	ml
03-ALB-025	MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE.	1-4	A-D	MAMP.	6.00	1.00	4.94		29.66	29.66	m3
DRENAJE							TOTAL			29.66	m3
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	1-4	A-D	EXC.	8.10	0.80	1.00		6.48	6.48	m3
										6.48	m3
03-ALB-019	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: ABISONADO	1-4	A-D	PLANTILLA	7.20				7.20	7.20	ml
										7.20	ml
18-RED-ALCA-006	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE , CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1-4	A-D	DESCARGA				2.00	2.00	2.00	pza
										2.00	pza
02-CIM-009	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE; SELECCION Y VOLTEO, A MANO	1-4	A-D	RELLENO	8.10	0.80	1.00		6.48	6.48	m3
AGUA POTABLE										6.48	m3
14-ACCES-003	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	1-4	A-D	CONEXIÓN				6.00	6.00	6.00	pza
										6.00	pza

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 6 DE 8	
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021		
MONTO CONTRATADO:	$	635,860.98	
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017		
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021		

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

UBICACIÓN: COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

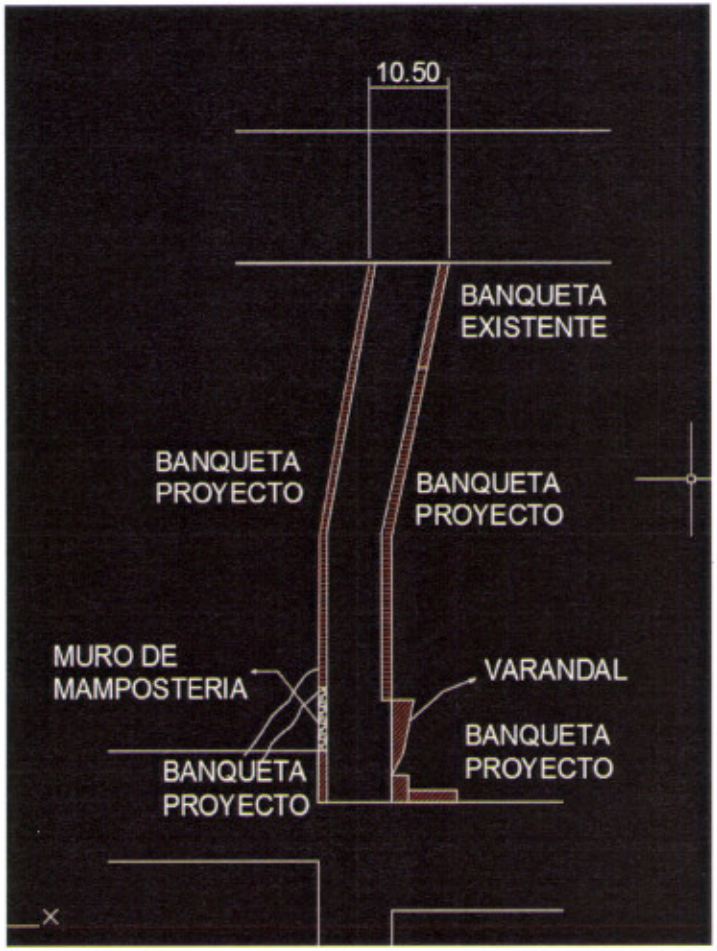

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO HOJA 7 DE 8	
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021	
MONTO CONTRATADO:	$ 635,860.98	
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017	
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
UBICACIÓN:	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 8 DE 8
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	635,860.98
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-017	
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DEL 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN LA COLONIA LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
UBICACIÓN:	COLONIA LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

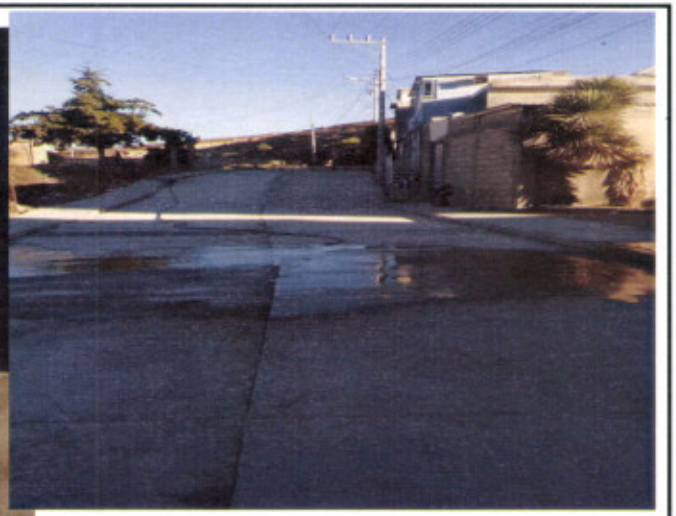

ING. LUIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
