FINIQUITO

HOJAS:	01 DE 11
PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009
FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2023

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	$ 93,093.14	$ 107,988.04	
02	CANCHA	1	LOTE	$ 854,030.33	$ 990,675.18	
03	TECHUMBRE	1	LOTE	$ 1,218,535.44	$ 1,413,502.06	
04	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	$ 40,394.45	$ 46,857.56	
	HERRERIA	1	LOTE	$ 15,161.64	$ 17,587.50	
				TOTAL DE FINIQUITO	$ 2,576,610.35	

FINIQUITO	$2,221,215.82
IVA 16%	$355,394.53
SUBTOTAL	$2,576,610.35
AMORT. DE ANTICIPO	
TOTAL	
SUBTOTAL	
IVA 16%	
TOTAL	

ANTICIPO OTORGADO	$ 772,983.11						
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	$ 772,983.11	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIM	0.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
ESTIMADO A LA FECHA:	$	2,576,610.35
ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR EJERCER	$	-

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A.DE C.V.

000137

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 11	SOMBRERETE	CONSTRUCCION:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023	BUENOS RESULTADOS	UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23 URB-009		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023			

DESGLOSE DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1,130 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	630.00	630.00	0.00	630.00	$ 15.50	$ -	$ 9,765.00
1-PRE-OP-02	DEMOLICION DE CONCRETO EXITENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	128.35	128.35	0.00	128.35	$ 124.08	$ -	$ 15,925.67
01-PRE-027	DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA , ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, POR MEDIOS MECANICOS CON RECUPERACION DE MATERIAL Y ACARREO	M3	89.56	89.56	0.00	89.56	$ 104.10	$ -	$ 9,320.25
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION. TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	315.39	315.39	0.00	315.39	$ 184.16	$ -	$ 58,082.22
	TOTAL DE PRELIMINARES							$ -	$ 93,093.14
02	CANCHA								
03-ALB-027	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4", INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2	153.00	153.00	0.00	153.00	$ 283.24	$ -	$ 43,335.72
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	153.00	153.00	0.00	153.00	$ 938.01	$ -	$ 143,515.53
1-PRE-OP-0(	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO A 90% P P S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	630.00	630.00	0.00	630.00	$ 382.38	$ -	$ 240,899.40
03-PAVI-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBIADO SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO COLOCACION DE MALLA CIMBA Y DESCIMBRA, COLADO CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	630.00	630.00	0.00	630.00	$ 661.86	$ -	$ 416,971.80
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDADAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE TRAZO ENMASCARILLADO PINTURA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 9,307.88	$ -	$ 9,307.88
	TOTAL DE CANCHA							$ -	$ 854,030.33
03	TECHUMBRE								
-E-ACERO-0	ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2 " X 2 " CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER ELEVACIONES (GRUA) SOLDADURA REBABEO CORTES	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	$ 27,711.32	$ -	$ 55,422.64
-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO SEGUN DISEÑO INCLUYE RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	$ 14,944.62	$ -	$ 29,889.24
				SUMA HOJA No. 01				$ -	$ -

ARQ. ANGEL CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SAMS S.A. DE C.V.

000138

FINIQUITO	HOJAS: 03 DE 11	SOMBRERETE	OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	MONTO CONTRATADO: $ 2,576,610.35		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO: MSO-ODS-FAISMUN-23-URB-009		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2023		

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
03	TECHUMBRE								
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M3	96.00	96.00	0.00	96.00	$ 339.80	$	$ 32,620.80
01-PRE-083	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA	M3	18.00	18.00	0.00	18.00	$ 241.54	$	$ 4,347.72
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO 8 A 10 CM ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE NIVELACIÓN MAESTREADO Y COLADO	M2	76.80	76.80	0.00	76.80	$ 208.15	$	$ 15,985.92
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCIÓN 1.20 X1.20 MTS CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO COLADO VIBRADO Y CURADO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 4,189.52	$	$ 50,274.24
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	ML	18.00	18.00	0.00	18.00	$ 3,252.23	$	$ 58,540.14
I-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	$ 442.26	$	$ 10,614.24
I-3-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NESESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 16,142.20	$	$ 193,706.40
I-E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	105.00	105.00	0.00	105.00	$ 1,299.60	$	$ 136,458.00
I-E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN SEPARADORES A CADA 80CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	$ 48,616.30	$	$ 291,697.80
03-ALB-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 509.27	$	$ 6,111.24
I-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	KG	342.00	342.00	0.00	342.00	$ 83.78	$	$ 28,652.76
	SUBTOTAL TECHUMBRE							$ -	$ 829,009.28
				SUMA HOJA No. 02				$ -	$ 1,022,715.68

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SIERRA DE C.V.

000139

FINIQUITO				
	HOJAS:	04 DE 11	OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023		
	MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35	UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	No. DE CONTRATO:	MSD-DOS-FAISMUN-23-URB-009	MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023	PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

SOMBRERETE
HO AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
03	TECHUMBRE								
-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	KG	319.20	319.20	0.00	319.20	$ 77.77	$ -	$ 24,824.18
-E-ACERO-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO	M2	630.00	630.00	0.00	630.00	$ 401.46	$ -	$ 252,919.80
-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14, INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1", INCLUYE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90º, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4" MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	ML	60.00	60.00	0.00	60.00	$ 366.38	$ -	$ 21,982.80
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 373.96	$ -	$ 4,487.52
	TOTAL DE TECHUMBRE							$ -	$ 1,218,535.44
04	INSTALACION ELECTRICA								
04-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS , INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 2,189.06	$ -	$ 26,268.72
04-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 1,690.85	$ -	$ 1,690.85
06-ELE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICO TWH DEL N0 12, 14, CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	$ 1,036.24	$ -	$ 12,434.88
04	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA							$ -	$ 40,394.45
09	HERRERIA								
09-HERR-00	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA CON TPR DE 2"X 2 , LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	$ 15,161.64	$ -	$ 15,161.64
	TOTAL DE HERRERIA							$ -	$ 95,850.54

SUMA HOJA No. 02 $ -

$ -

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SM S.A.DE C.V.

000170

FINIQUITO		
	HOJAS:	05 DE 11
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: $	2,576,610.35
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDAD
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1,130 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	1-2	A-B		19.00	33.15			630.00	630.00	M2
							TOTAL		630.00		M2
01-PRE-OP-020	DEMOLICION DE CONCRETO EXITENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL MANO DE OBRA HERRAMENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1-2	A-B		1.50	85.57			128.35	128.35	M2
							TOTAL		128.35		M2
01-PRE-027	DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA ASENTADO CON CEMENTO-ARENA POR MEDIOS MECANICOS CON RECUPERACION DE MATERIAL Y ACARREO	1-2	A-B		96.00	0.93					M2
							TOTAL		89.36		M2
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU	1-2	A-B		96.00	2.00	1.64		315.39	315.39	M3
							TOTAL		315.39		M3
03-ALB-027	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4" INCLUYE MATERIALES HERRAMENTA MENOR Y MANO DE OBRA	1-2	A-B		96.00		1.59		153.00	153.00	M2
							TOTAL		153.00		M2
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B		96.00		1.59		153.00	153.00	M2
							TOTAL		153.00		M2
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		18.00	30.00	1.17		630.00	630.00	M3
							TOTAL		630.00		M3
03-PAVI-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 10/10 F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBIADO SECCIONADO EN	1-2	A-B		18.00	35.00			630.00	630.00	M2
							TOTAL		630.00		M2

171001

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

FINIQUITO		
	HOJAS:	06 DE 11
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: $	2,576,610.35
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDAD
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDADAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE TRAZO, ENMASCARILLADO PINTURA MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
							TOTAL		1.00		PZA
19-E-ACERO-030	ARMADURA A 2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL TRABAJOS DE TALLER ELEVACIONES (GRUA) SOLDADURA REBABEO CORTES	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL		2.00		PZA
19-E-ACERO-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO SEGUN DISENO	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL		2.00		PZA
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	1-2	A-B		96.00	0.60	1.67		96.00	96.00	M3
							TOTAL		96.00		M3
01-PRE-083	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION COMPACTADO CON PISON DE MADERA	1-2	A-B		1.50	1.50	8.00		18.00	18.00	M3
							TOTAL		18.00		M3
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO 8 A 10 CM ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE NIVELACION MAESTREADO Y COLADO	1-2	A-B		8.50	9.04			76.80	76.80	M2
							TOTAL		76.80		M2
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F"C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20 X1.20 MTS CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO COLADO VIBRADO Y CURADO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
							TOTAL		12.00		PZA
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO 5 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 20CM SECCIÓN 40 X 55CM	1-2	A-B					18.00	18.00	18.00	ML
							TOTAL		18.00		ML

ARQ. YESHIA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS DEL S.A.DE C.V.

000142

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 11
	PERIODO	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO	$ 2,576,610.35
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-009
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDAD
19-E-ACERO-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL			24.00	PZA
19-3-ACERO-004	SUMINISTRO HABILITADO ARMADO SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES DESPERDICIOS MANO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
							TOTAL			12.00	PZA
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO	1-2	A-B					92.00	92.00	92.00	PZA
							TOTAL			105.00	PZA
19-E-ACERO-010	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN DIAGONALES PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN	1-2	A-B					6.00	6.00	6.00	PZA
							TOTAL			6.00	PZA
03-ALB-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
							TOTAL			12.00	PZA
19-E-ACERO-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO	1-2	A-B					285.00	285.00	285.00	KG
							TOTAL			342.00	KG
19-E-ACERO-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	1-2	A-B					266.00	266.00	266.00	KG
							TOTAL			319.20	KG
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 26. INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO	1-2	A-B			18.00	35.00		630.00	630.00	M2
							TOTAL			630.00	M2

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SOZ S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	08 DE 11
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: $	2,576,610.35
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-009
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERAD

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDAD
19-E-ACERO-008		1-2	A-B		60.00				60.00	60.00	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90° ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4" MANO DE OBRA, HERRAMENTA										
							TOTAL			60.00	ML
03-ALB-039		1-2	A-B		12.00				12.00	12.00	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMENTA Y EQUIPO										
							TOTAL			12.00	ML
04-ELECT-553		1-2	A-B					10.00	10.00	10.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE ACARREO MANO DE OBRA HERRAMENTA Y EQUIPO										
							TOTAL			12.00	PZA
04-ELECT-554		1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS ACARREO MANO DE OBRA HERRAMENTA Y EQUIPO										
							TOTAL			1.00	PZA
06-I.ELE-009		1-2	A-B					10.00	10.00	10.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 CABLE ELECTRICO TWH DEL NO 12 14 CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO										
							TOTAL			10.00	PZA
09-HERR-007		1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00x2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA CON TPR DE 2 X 2 LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA										
							TOTAL			1.00	PZA

ARQ. YESICA CORONADO ESTOPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS RMZ S.A.DE C.V.

000144

FINIQUITO			
	HOJAS:	09 DE 11	
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023	
	MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009	
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023	

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

CROQUIS DE OBRA

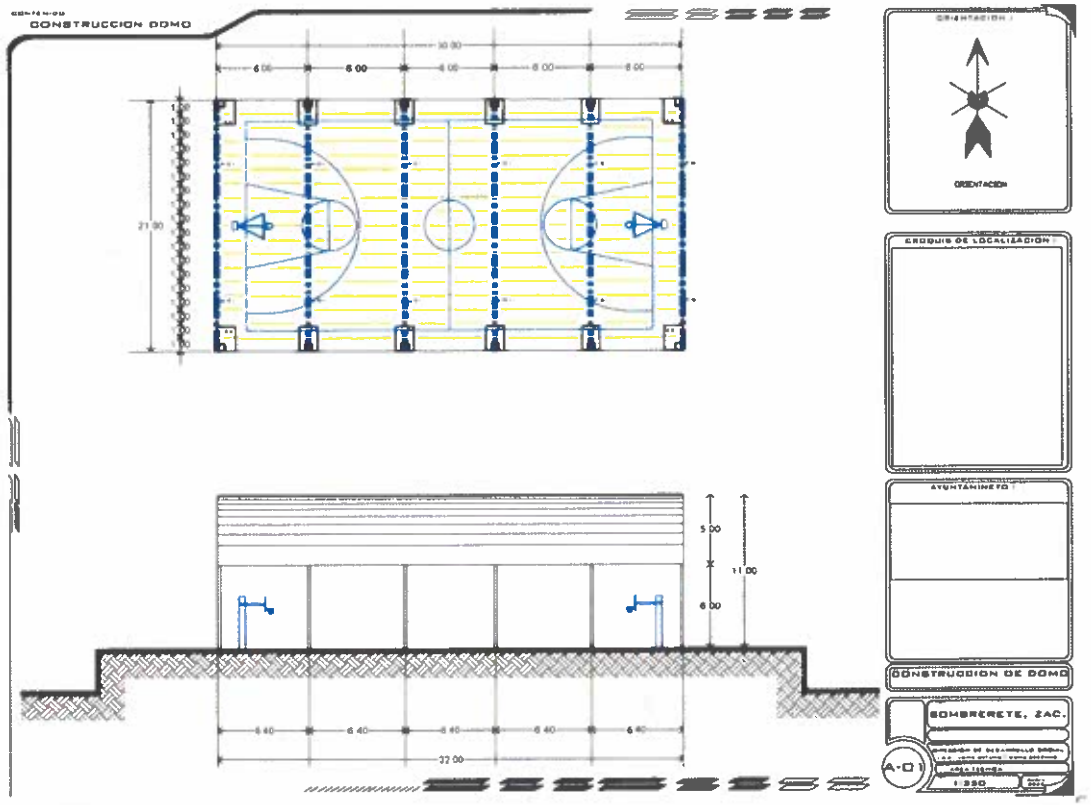

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A.DE C.V.

000145

FINIQUITO			
	HOJAS:		10 DE 11
	PERIODO:		26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO:	$	2,576,610.35
	No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009
	FECHA:		06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

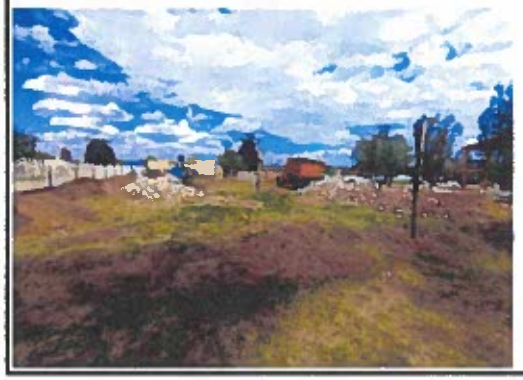

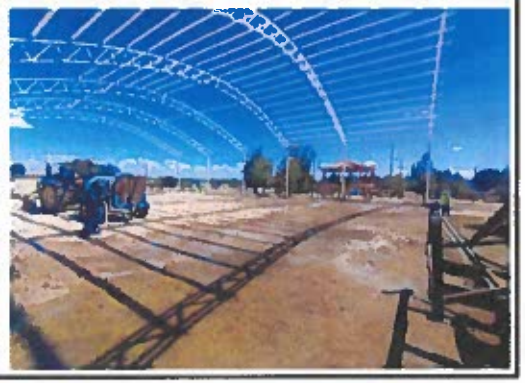

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.

000146

FINIQUITO				
	HOJAS:	11 DE 11	SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
	MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023		

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

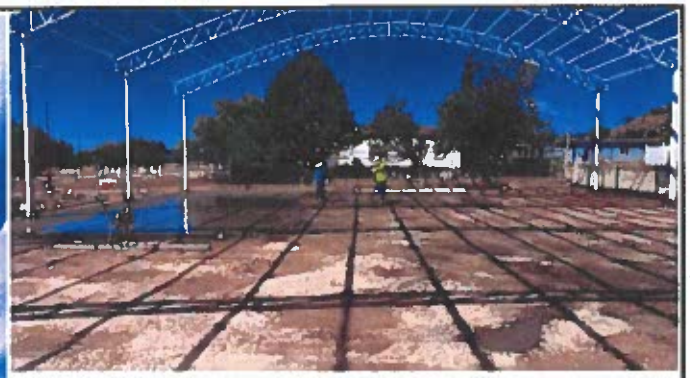

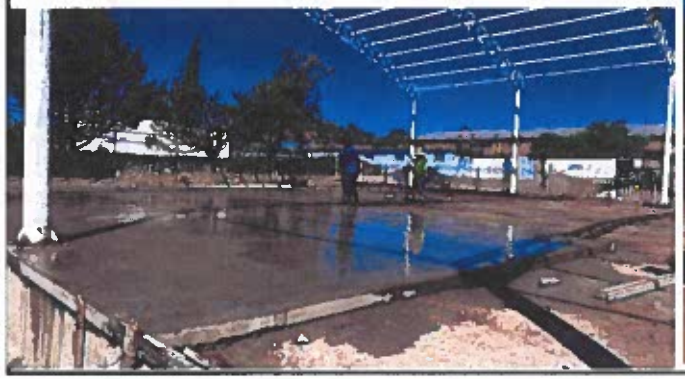

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A.DE C.V.

100147

ESTIMACION 01	HOJAS:	10 DE 11	
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023	
	MONTO CONTRATADO:	$ 2,576,610.35	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009	
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023	

SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

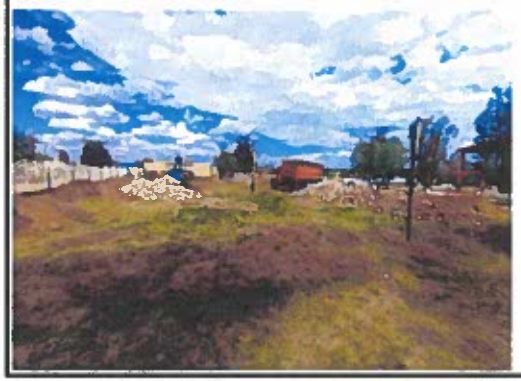

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A.DE C.V.

210146

ESTIMACION 01	HOJAS: 11 DE 11 PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 MONTO CONTRATADO: $ 2,576,610.35 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-009 FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2023	SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA UBICACIÓN: LOCALIDAD DE AGUA ZARCA MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

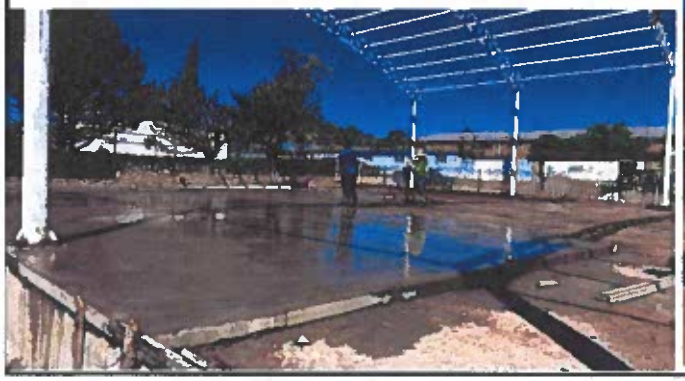

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A.DE C.V.

00143
